X 项目规划

- 确保项目内容同步到位，任务共识清晰明确
- 关键事项按日报形式输出

初版项目看板

开发精简版项目排期

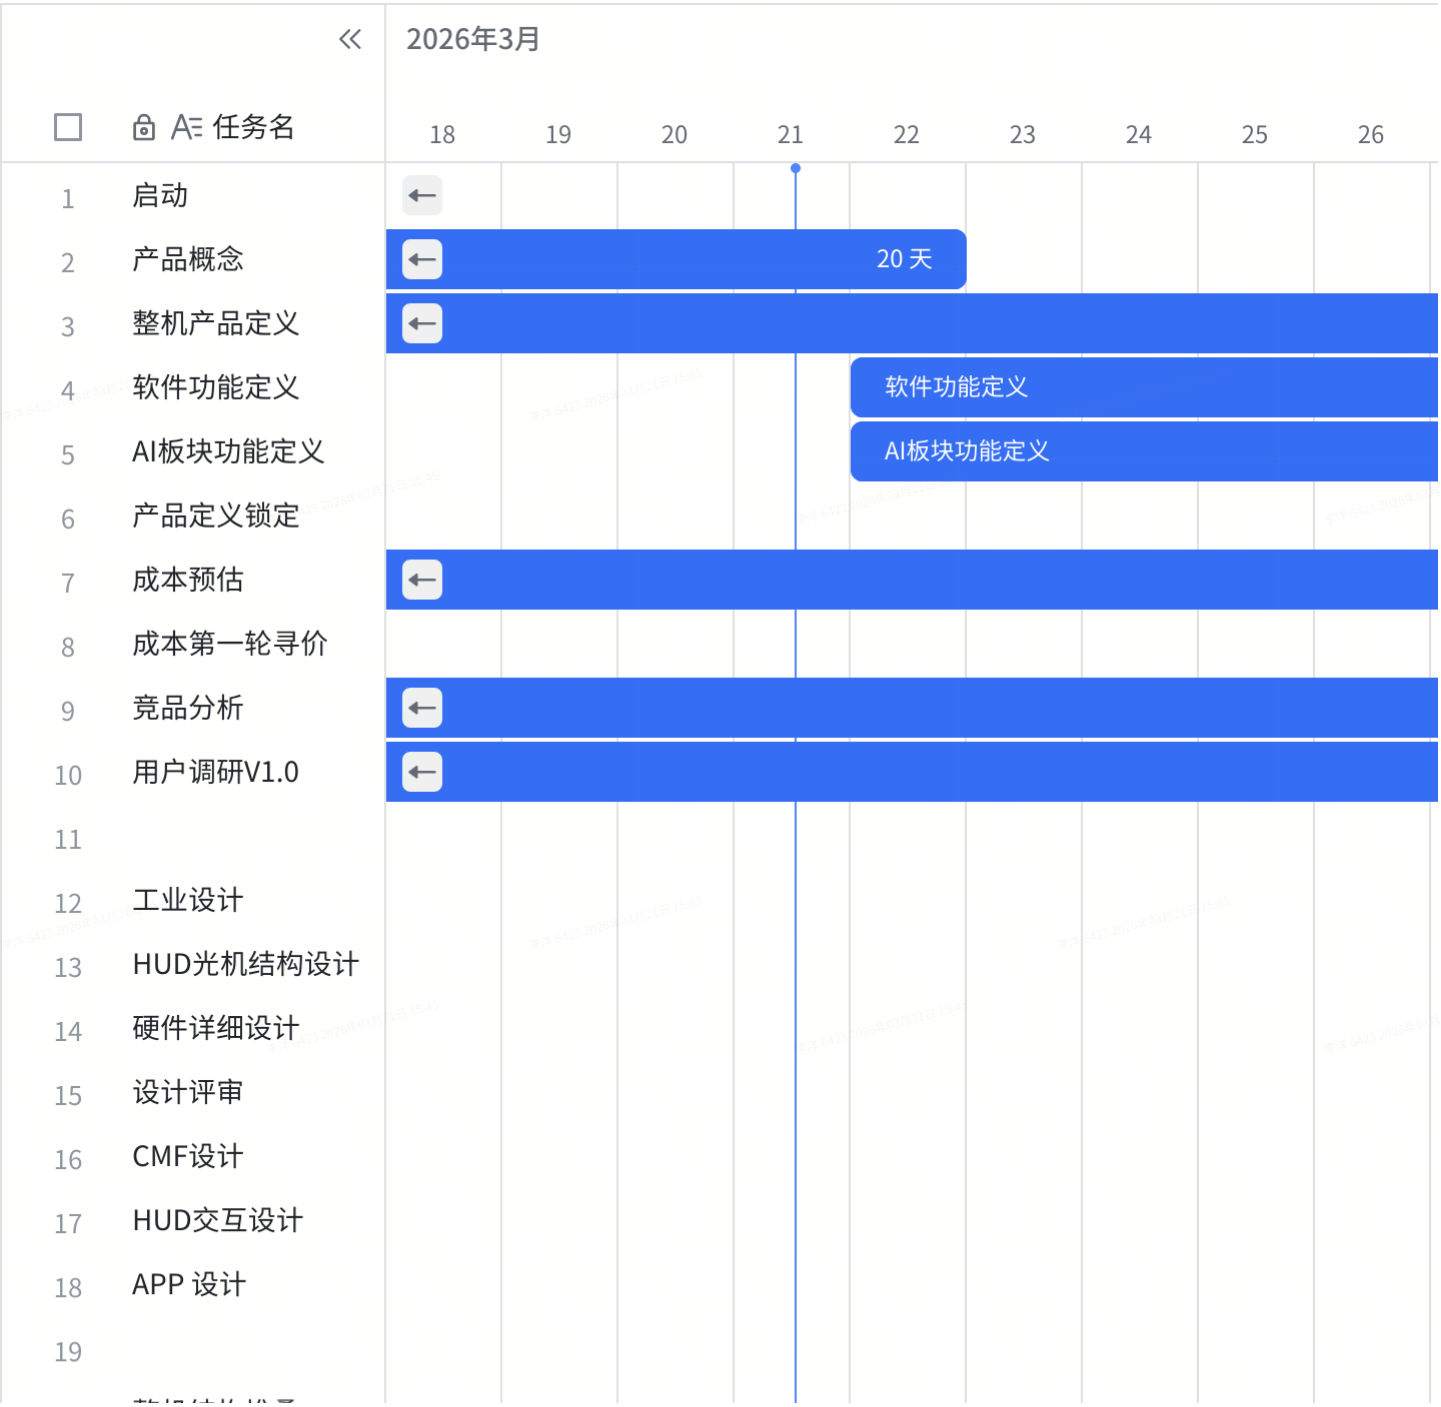

20	整机结构堆叠												
21	视觉模块&雷达...												
22	声学模块												
23	头盔结构主体设计												
24	声/光/视，点亮...												
25	结构评审												
26													
27	SE系统架构												SE系统架
28													
29	硬件堆叠												
30	原理图及PCB输出												

项目计划	主R		概念阶段					重庆摩展		ECI MA-欧洲 11/3		CES-北美	
节点													
时间		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	27年1月

目的		明确产品定位 用户画像 核心功能	确保产品定义清晰，产品概念设计满足产品需求		整机硬件方案满足产品定义并基本锁定 风险识别并有对应解决方案 技术成熟度可以支持立项				DEMO完成 基本功能跑通 产品化完成	满足欧洲参展全部关键活动			
项目组		产品定义梳理 成本预估 竞品分析 项目计划	**整机PRDV 0.5** **产品路标讨论** 初版成本预估完成 主要竞品分析完成 **项目计划V0.5**	整机PRDV1.0锁定 产品路标锁定 第二版成本预估完成 项目主计划锁定 项目启动决策									
用研			第一轮深度用户调研完成（访谈/问卷)	第二轮深度用户调研完成	N/A								
设计			初步产品ID方向明确 HUD交互逻	ID设计方案2轮输出	ID方案锁定 CMF方案2轮输出								

			辑框架完成	HUD人机界面2轮输出	HUD人机界面方案细化								
结构			结构供应商初步沟通	结构供应商锁定 结构初版堆叠完成	模块结构堆叠启动 头盔结构供应商锁定								
硬件			初步堆叠完成 原理图及PCB部分锁定 关键器件清单 可行性评估完成		硬件原理图/PCB layout锁定 关键器件清单锁定 整机BOM								
软件			软件产品规格书完成（PRD) 软件产品概念可行性评估完成										
软测			软件测试方案制定										
硬测			硬件测试方案制定										
质量			质量标准方案制定										
制造工程			架构堆叠可制作性评估										

供应链			主要供应商初步沟通完成	主要供应商锁定	供应商资源确认 整机CBD询价初版								
认证			产品合规性摸底		合规性排查通过 产品认证方案确定								
法务/专利			专利风险评估		专利风险评估结论								
业务目标			需求表锁定		N/A								

关键事项日报

0227关键事项

1. 产品定位聚焦核心需求，识别Top3核心卖点，通过深度用户调研（分别针对新手/熟练/专业用户做差异洞察）
2. 规划产品路标图，明确首款产品及第二代产品的核心功能，明确技术平台与产品线的耦合
3. 硬件架构按潜在2年的竞争趋势做平台级冗余，满足至少未来2年的竞争环境。避免重复开发，过快失去竞争力
4. 项目计划制定，首要拉齐3-5月的关键行动项
5. 产品定义初步锁定后，关键供应商启动对接
6. 业务目标（商业/战略）

0228关键事项

3月工作内容看板，拉齐现状
